

Průběžná monitorovací zpráva č. 4

Implementační plán Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024

Tento dokument vznikl na základě usnesení RHMP číslo 1936 ze dne 7. 9. 2020 jako nástroj realizace Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu a byl schválen RHMP usnesením č. 2854 ze dne 16. 12. 2024. Verze po jazykové korektuře.

Připravilo:


Oddělení environmentálních projektů
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
adaptacepraha.cz | adaptace@praha.eu
listopad 2024

Podkladový návrh:

INCONEX, a.s.



**STRATEGIE
ADAPTACE**
HL. M. PRAHY NA
ZMĚNU KLIMATU



Obsah

Seznam zkratk	3
Úvod	4
Stav zásobníku projektů IP 2020–2024 na koci roku 2024 (odborníky, městské organizace a společnosti ve vlastnictví HMP)	5
Projekty městských organizací finančně podpořené v r. 2024	6
Koncepce a systém zelené infrastruktury v Praze	6
Projekty městských organizací a odborů MHMP zahájené v r. 2024	7
Klimatické stromy pro Prahu	7
Inovační projekt „Mapa oáz chladu“	7
Projekty městských organizací a odborů MHMP ukončené v r. 2024	8
Stav zásobníku projektů IP 2020–2024 na konci roku 2024 (městské části Prahy)	9
Projekty městských částí finančně podpořené v r. 2024	10
Struktura realizovaných projektů MČ v r. 2024	15
Projektové řízení IP 2020–2024	16
Komunikační aktivity Strategie adaptace v roce 2024	16
Vzdělávací aktivity Strategie adaptace v roce 2024	17
Akce pro veřejnost	17
Outdoorová kampaň ke zmírňování dopadů vysokých teplot na obyvatele Prahy	17
Adaptterra Awards 2024	17
Odborné semináře	17
Jak připravit kvalitní adaptační projekt	17
Mikroklimatická měření jako klíč k efektivní adaptaci	18
Konference	18
Pracovní skupina pro adaptaci	19
Souhrn a závěry	20
Příloha 1 – Monitoring vědeckovýzkumných projektů	21
Doporučení pro monitorování využití ukončených projektů:	21
Doporučení pro monitorování probíhajících projektů:	22
Příloha 2 – Vybrané příklady realizovaných adaptačních projektů v roce 2024	24
MČ Praha 4	24
Pobytová zahrada Jílovská	24
MČ Praha 7	26
Nová výsadba stromů Ortenovo náměstí	26
MČ Praha 20	27
Obnova Nolčova parku a parku Chvaly	27
MČ Praha Satalice	28
Založení květinového záhonu v ul. K Radonicům	28
MČ Praha Vínohrad	29
Předzámčí Vínohradského zámku	29

Seznam zkratk

Strategie adaptace	Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017)
HMP	Hlavní město Praha
IP 2020–2024	Implementační plán Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024
IP 2025–2029	Implementační plán Strategie adaptace hlavního města Prahy na změnu klimatu pro období 2025–2029
MČ	Městská část
MHMP	Magistrát hlavního města Prahy
OCP	Odbor ochrany prostředí
RHMP	Rada hlavního města Prahy

Úvod

Letos oslavila Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu sedmý rok od svého schválení. Přestože se jednalo o vůbec první klimatický dokument Prahy a jeho naplňování znamenalo prošlapávání poměrně neznámých cest, za tuto dobu bylo realizováno mnoho významných kroků a hl. m. Praha za toto období podpořila finančně přes 260 projektů v celkové hodnotě 550 milionů korun.

Průběžná monitorovací zpráva č. 4 [Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024](#) (dále jen IP 2020–2024) je zaměřena na sledování realizace projektů IP 2020–2024. Zpráva poskytuje vedení hlavního města Prahy aktuální informace o stavu realizace adaptačních projektů v rámci IP 2020–2024 pro rok 2024.

Podkladem pro přípravu monitorovací zprávy č. 4 byla průběžná komunikace s jednotlivými garanty projektů během roku 2024 a také celková revize projektů v zásobníku IP 2020–2024, kterou zpracovalo během roku 2024 Oddělení environmentálních projektů OCP MHMP.

Datem uzavření sběru dat od městských částí a městských organizací a odborů MHMP byl pátek 15. 11. 2024.

Průběžný monitoring je zaměřen na sledování realizace projektů Implementačního plánu pro zajištění informací k řídicím strukturám Implementačního plánu a naplňování cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Součástí této monitorovací zprávy není, tak jako u předchozích zpráv, aktualizovaný projektový zásobník. Rok 2024 byl posledním implementačním rokem IP 2020–2024 a namísto aktualizace stávajícího projektového zásobníku proběhla celková revize a vyhodnocení tohoto zásobníku, které je součástí Hodnotící zprávy Implementačního plánu 2020–2024 Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (OCP MHMP, listopad 2024).

Tato monitorovací zpráva navazuje na předchozí zprávy č. [1](#), [2](#) a [3](#), které jsou dostupné na webu adaptacepraha.cz.

Cílem zprávy je popsat a shrnout naplňování IP 2020–2024 v implementačním roce 2024.

Stav zásobníku projektů IP 2020–2024 na koci roku 2024 (odborníky, městské organizace a společnosti ve vlastnictví MHMP)

Detailnější porovnání výše finanční podpory a počet realizovaných projektů v roce 2024 vůči předchozím letům IP 2020–2024 jsou součástí Hodnotící zprávy Implementačního plánu 2020–2024 Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (OCP MHMP, listopad 2024).

Tyto subjekty měly v roce 2024 celkem **146 projektů** v adaptačním zásobníku IP 2020–2024.

Z toho:

- **Jeden zrušený projekt** (celková investice ve výši cca 150 mil. Kč)

(Jednalo se o projekt BIOMETAN, VYUŽITÍ KALOVÉHO PLYNU NA ÚČOV PRAHA, DOSTAVBA, PVS a.s. Projekt nebyl zahájen. Bude realizován společně s rekonstrukcí a modernizací Kalového a energetického hospodářství po roce 2030.)

- **54 probíhajících projektů** (celkové investice ve výši cca 9 mld. 363 mil. Kč*)

*Vysoká hodnota investic je tvořena velkými infrastrukturními projekty, které již běží a jsou financovány z rozpočtu MHMP, například projekty THMP a.s. – Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení – LED svítidla ve výši 1,3 mld. Kč, nebo projekt DOBÍJECÍ STANICE – VÝSTAVBA NOVÝCH NABÍJECÍCH BODŮ PRO ELEKTROMOBILY ve výši 886 mil. Kč

- **33 projektů ve stavu záměru** (celkové investice ve výši cca 5 mld. 731 mil. Kč**)

**Vysoká hodnota investic je tvořena především jedním plánovaným infrastrukturním projektem PVS a.s. – ENERGO-CENTRUM PRO VYUŽITÍ NÍZKOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA Z ÚČOV ve výši 5,5 mld. Kč

- **Tři ukončené projekty v r. 2020** (celkové investice ve výši cca 2,5 mil. Kč)
- **18 ukončených projektů v r. 2021** (celkové investice ve výši cca 30,6 mil. Kč)
- **19 ukončených projektů v r. 2022** (celkové investice ve výši cca 63,8 mil. Kč)
- **Osm ukončených projektů v r. 2023** (celkové investice ve výši cca 625,3 mil. Kč***)

*** Vysoký údaj celkových investic ovlivňují dva dokončené projekty PVS a.s. s názvem Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína, Praha 8 za 499,2 mil. Kč, a Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pilotní projekt za 66,4 mil. Kč

- **Sedm ukončených projektů v r. 2024** (celkové investice ve výši cca 9,7 mil. Kč)

Projekty městských organizací, odborů MHMP a městských společností, které byly ukončeny v roce 2024, jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Projekty městských organizací finančně podpořené v r. 2024

V rámci naplňování IP 2020–2024 byl podpořen jeden projekt městské organizace v hodnotě 2 mil. Kč, který je součástí schváleného Zásobníku projektů Strategie adaptace.

Koncepce a systém zelené infrastruktury v Praze

Zpracovatel: IPR Praha

Zadavatel: OCP MHMP, Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Částka: 2,5 mil. Kč

Usnesení RHMP č. číslo 674 ze dne 15. 4. 2024 k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy v kap. 01 a kap. 02 v souvislosti s plněním aktivit Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020–2024

Délka projektu: 04/2024–04/2026

Cílem projektu je především na celoměstské úrovni propojit následující témata:

- Adaptace města na změnu klimatu,
- zvyšování kvality zeleně v Praze, identifikace deficitů zeleně
- poskytování ekosystémových služeb městskou vegetací,
- efektivnější propojování jednotlivých zelených ploch ve městě a mezi jednotlivými městskými částmi
- a zlepšení koordinace rozvoje zelené infrastruktury mezi strategickými dokumenty, územním plánováním a konkrétními projekty v území na úrovni celé Prahy, ale i městských částí.

Projekt zahrnuje také zpřesnění metodiky pro tvorbu Studií systému sídelní zeleně, na které Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotační titul pro obce a městské části Prahy v rámci OPŽP.

Vytvoření systému zelené infrastruktury je jedním z hlavních opatření schválené Strategie adaptace, specifický cíl A.

Projekty městských organizací a odborů MHMP zahájené v r. 2024

Klimatické stromy pro Prahu

Adaptační projekt z projektového zásobníku Adaptace, schválený RHMP v roce 2022, přinesl první výsledky v podobě nově vysazených stromů.

Stávající druhy stromů v ulicích jsou postupující klimatickou změnou ohroženy a do budoucna mohou z ulic zcela zmizet. Cílem nového projektu je vysadit a v náročných městských podmínkách testovat 30 nových druhů stromů, které mohou tradiční druhy zastoupit. Ty, které se osvědčí jako nejodolnější vůči klimatickým změnám, se stanou základem budoucí městské vegetace. Projekt počítá s testovacím vzorkem 900 stromů vysazených přímo do pražských ulic. Tyto stromy poskytnou unikátní data k výběru nejvhodnějších druhů.

Pilotní výsadba jednoho z testovaných druhů, konkrétně jilmu (*Ulmus* „Lutece“), byla realizována na jaře roku 2024 na Ovocném trhu. Další výsadba následovala na podzim 2024 na Strossmayerově náměstí.

Hlavním garantem projektu je Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu, hlavním řešitelem pak Technická správa komunikací a odborným garantem společnost CVVMZI. K dalším partnerským městským organizacím patří také Lesy hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Inovační projekt „Mapa oáz chladu“

Pro OCP MHMP, v rámci pilotního programu Inovačního managementu, začal Operátor ICT připravovat koncept projektu Systému opatření zvládnutí vysokých teplot a dlouhých vln veder v Praze. Výstupem činnosti pro projektový zásobník IP 2025–2029 bude v r. 2025 Projektový záměr na postupnou tvorbu takového systému.

Projekty městských organizací a odborů MHMP ukončené v r. 2024

	Garant projektu	Název projektu	Typ projektu	Rok vložení projektu do zásobníku	Stav projektu	Celková výše investice	Zdroj financování
1	Operátor ICT a.s.	Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí	Studie a koncepční dokumenty	2022	ukončen 2024	2 700 000 Kč	PRI MHMP, OICT a.s.
2	PVS a.s.	Koncepce hospodaření s dešťovou vodou – vzorová výstavba prvků HDV na konkrétním území, MHMP, PVS	Studie a koncepční dokumenty	2020	ukončen 2024		Rozpočet HMP, náklady byly hrazeny v rámci rozpočtu na identifikaci oddílné srážkové kanalizace.
3	OCP MHMP	Revitalizace Vesteckého potoka v k. ú. Kunratice, Praha – Kunratice	Revitalizace vodních toků	2020	ukončen 2024	7 000 000 Kč	OCP MHMP
4	IPR Praha	Soutok – Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) – revitalizace říční nivy v rámci velkotržnice Lipence	Studie a koncepční dokumenty	2020	ukončen 2024		IPR Praha
5	IPR Praha	Soutok – Koncepce rozvoje území Příměstského parku Soutok (PPS) – management území	Studie a koncepční dokumenty	2020	ukončen 2024		IPR Praha
6	IPR Praha	Soutok – Koncepce rozvoje říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy	Studie a koncepční dokumenty	2020	ukončen 2024		IPR Praha
7	IPR Praha	Soutok – Rekonstrukce lávky v Dolních Černošicích, urbanistická soutěž, Praha – Lipence	Studie a koncepční dokumenty	2020	ukončen 2024		IPR Praha

Celkem 9 700 000 Kč

Tab. 1.

Přehled ukončených projektů Odborů MHMP a městských organizací v roce 2024

Stav zásobníku projektů IP 2020–2024 na koci roku 2024 (městské části Prahy)

Městské části Prahy měly v roce 2024 celkem **534 projektů** v adaptačním zásobníku IP 2020–2024.

Z toho:

- **35 zrušený projekt** (celková investice ve výši cca 49,9 mil. Kč)
- **172 probíhajících projektů** (celkové investice ve výši cca 2 mld. 164 mil. Kč)
- **73 projektů ve stavu záměru** (celkové investice ve výši cca 661 mil. Kč)

Struktura ukončených projektů dle let:

- **17 ukončených projektů v r. 2020** (celkové investice ve výši cca 13,6 mil. Kč)
- **60 ukončených projektů v r. 2021** (celkové investice ve výši cca 179,8 mil. Kč)
- **94 ukončených projektů v r. 2022** (celkové investice ve výši cca 389,7 mil. Kč)
- **24 ukončených projektů v r. 2023** (celkové investice ve výši cca 86,7 mil. Kč)
- **28 ukončených projektů v r. 2024** (celkové investice ve výši cca 128,1 mil. Kč)

Projekty městských částí ukončených v roce 2024 jsou rozepsány v tabulce číslo 3.

*K datu zpracování tohoto dokumentu nebyla u všech projektů známa celková výše ceny realizace, jedná se tak o orientační údaj.

Projekty městských částí finančně podpořené v r. 2024

V roce 2024 byly podpořeny adaptační projekty městských částí zařazených v projektovém zázobníku Strategie adaptace **usnesením RHMP číslo 645 ze dne 15. 4. 2024** k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2024 a k poskytnutí dotací městským částem hl. m. Prahy na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030.

Finanční podpora městských částí proběhla úpravou rozpočtu běžných výdajů – poskytnutím účelových neinvestičních dotací MČ HMP – a úpravou rozpočtu kapitálových výdajů – poskytnutí účelových investičních dotací MČ HMP.

Většina podpořených projektů se týká výsadby stromů a další vegetace, včetně stále oblíbenějších lučních porostů. Jednalo se ale i o revitalizaci parků a vnitrobloků či budování objektů pro hospodaření s dešťovou vodou. Duben 2024 přinesl další kolo podpory jednotlivých projektů, které byly vybírány na základě žádostí jednotlivých městských částí ze schváleného Zázobníku projektů (usnesení RHMP č. 2792 z prosince 2023).

Praha podpořila v roce 2024 celkem 23 projektů městských částí v celkové výši 23,9 milionu korun.

Mezi podpořené projekty patří například revitalizace parku v ul. Věštínská (Praha 16), revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Vítkovická (Praha 18), revitalizace zahrady Ústavu sociálních služeb (Praha 4) nebo podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích škol (Praha 21). Podrobnější informace o jednotlivých podpořených projektech v roce 2024 jsou uvedeny v tabulce č. 2 a příklady jejich realizací na konci této Monitorovací zprávy.

	Městská část	Číslo akce	Účel / Název akce	Částka (Kč)	Stav na konci roku 2024
1	Praha 3	82067	Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou	1 300 000	realizován
2	Praha 4	82068	Revitalizace zahrady Ústavu sociálních služeb	2 000 000	realizován
3	Praha 6	82069	Nakládání se srážkovými vodami – Odvodnění chodníku Baba	400 000	realizován
4	Praha 6	71628000006	Dočasné řešení ploch na Vítězném náměstí	1 500 000	probíhá
5	Praha 12	82070	Krajinářské úpravy pietního místa u ul. Branišovské	500 000	realizován
6	Praha 12	71628000012	Obnova sídelní zeleně	800 000	probíhá
7	Praha 13	82071	Přepojení dešťové kanalizace do rybníku v Panské zahradě a související úpravy	2 000 000	probíhá
8	Praha 15	71628000015	Výsadby stromů a keřů, úprava sídlištní zeleně	800 000	probíhá
9	Praha 16	71628000016	Revitalizace parku v ul. Věštínská	2 000 000	probíhá

10	Praha 18	71628000018	Revitalizace vnitrobloku ulic Šumperská a Vítkovická	3 000 000	probíhá
11	Praha 19	82072	Zlepšování mikroklimatických podmínek – revitalizace Náměstí Fr. Strašila jako zeleného ostrova v centru MČ	1 700 000	probíhá
12	Praha 20	82073	Řešení odvodu dešťových vod ÚMČ Jívanská 647	800 000	realizován
13	Praha 20	82074	Obnova stromořadí v Běchorské ulici	800 000	probíhá
14	Praha 21	82075	Podzemní nádrže na dešťovou vodu na pozemcích MŠ a ZŠ	2 000 000	probíhá
15	Praha 22	71628000022	Úprava povrchů Husovo náměstí	350 000	probíhá
16	Praha Čakovice	71628000026	Revitalizace části břehu Mratínského potoka a přilehlého prostranství	950 000	probíhá
17	Praha Dubeč	82076	Revitalizace dětského hřiště U Lipové aleje a vybraných ploch ve správě městské části Praha-Dubeč	1 100 000	probíhá
18	Praha Kolovraty	82077	Hospodaření s dešťovou vodou – Kolovraty V Tehovičkách	500 000	realizován
19	Praha Kolovraty	71628000034	Zakládání trávinybylinných porostů	250 000	realizován
20	Praha Kunratice	82078	Regenerace dřevin na hřbitově v Praze-Kunraticích	550 000	probíhá
21	Praha Satalice	71628000047	Revitalizace trávníků – založení lučních porostů	200 000	probíhá
22	Praha Slivenec	71628000048	Doplnění vegetačních prvků	70 000	probíhá
23	Praha Újezd	82079	Regenerace a údržba zeleně na Milíčovských kopcích	300 000	probíhá

Celkem 23 870 000 Kč

Tab. 2.

Přehled projektů městských částí finančně podpořených
15. 4. 2024 usnesením RHMP v rámci Strategie adaptace

	Garant projektu	Název projektu	Typ projektu	Rok vložení projektu do zásobníku	Stav projektu	Celková výše investice (Kč)	Zdroj financování
1	MČ Praha 3	Revitalizace vnitrobloku Flora	Revitalizace vnitrobloků a zahrad	2022	ukončen 2024	1 032 638	vlastní prostředky
2	MČ Praha 3	Výsadba stromů v ulici Za Žižkovskou vozovnou	Výsadba stromů	2023	ukončen 2024	2 495 522	1 300 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024 a vlastní prostředky
3	MČ Praha 4	Revitalizace Branického náměstí	Revitalizace veřejného prostranství	2022	ukončen 2024	13 000 000	3 000 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 a zbytek financovala společnost Trigema v rámci kontribuce, cca 10 mil. Kč
4	MČ Praha 4	Pobytová zahrada Jílovská (Ústav sociálních služeb v Praze 4)	Revitalizace vnitrobloků a zahrad	2023	ukončen 2024	2 000 000	2 000 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024
5	MČ Praha 6	Nakládání se srážkovými vodami – Odvodnění chodníku Baba	Přírodě blízké prvky HDV ve veřejném prostoru a krajině	2023	ukončen 2024	2 420 000	400 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024 a vlastní prostředky
6	MČ Praha 6	Podzemní nádrže na dešťovou vodu v parku Královka – PD a realizace	Technické Retenční a zasakovací objekty	2021	ukončen 2024		3 500 000 Kč usnesením RHMP č. 1452 ze dne 14.6. 2021 a 3 200 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022
7	MČ Praha 7	Park U Vody	Realizace nového parku	2021	ukončen 2024	45 000 000	5 000 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 a vlastní prostředky
8	MČ Praha 7	Založení tří záhonů záhonů v ulici Nad Štolou včetně tříleté následné údržby → nově Kompletní rekonstrukce záhonu v parku sv. Antonína	Realizace trvalkových záhonů, dešťových záhonů a swalů	2021	ukončen 2024	219 086	300 000 Kč usnesením RHMP č. 1452 ze dne 14. 6. 2021
9	MČ Praha 7	Rekonstrukce vnitrobloku U Uranie	Revitalizace vnitrobloků a zahrad	2022	ukončen 2024	14 000 000	5 000 000 Kč usnesením RHMP 19/31 ze dne 10. 9. 2020 a 5 000 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 (realizace) a vlastní prostředky

10	MČ Praha 7	Výsadba stromů v ulici Milady Horákové – Projektová dokumentace	Výsadba stromů	2021	ukončen 2024	750 000	750 000 Kč usnesením RHMP č. 1452 ze dne 14. 6. 2021
11	MČ Praha 7	Nová výsadba stromů – Ortenovo náměstí – Vzorový projekt výsadby stromů s použitím prvků modrozelené infrastruktury	Výsadba stromů	2022	ukončen 2024	1 500 000	450 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 a 1 800 000 Kč usnesením RHMP číslo 2334 ze dne 23. 10. 2023
12	MČ Praha 12	Přeměna nepropustných povrchů na propustné	Přírodě blízké prvky HDV ve veřejném prostoru a krajině	2023	ukončen 2024	9 000 000	Dotace SFŽP (Norské fondy) a vlastní prostředky
13	MČ Praha 12	Krajinářské úpravy pietního místa u ul. Branišovské	Revitalizace veřejného prostranství	2023	ukončen 2024	500 000	500 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024
14	MČ Praha 13	Dvě dětská hřiště na Velké Ohradě	Revitalizace veřejného prostranství	2023	ukončen 2024	14 500 000	14 500 000 Kč usnesením č. 2/3 ze dne 23. 3. 2023 (usnesení mimo adaptační usnesení) dotace dle usnesení ZHMP č.2/3 ze dne 23. 3. 2023 – poskytnutí účelové dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (kap. 10)
15	MČ Praha 20	Řešení odvodu dešťových vod ÚMČ Jívanská 647	Opatření proti přívalovým srážkám, dešťové kanalizace	2023	ukončen 2024	654 114	800 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024
16	MČ Praha Čakovice	Kontejnerová stání pro tříděný odpad	Odpadové hospodářství	2021	ukončen 2024	401 478	vlastní prostředky
17	MČ Praha Dolní Počernice	Revitalizace parčíku U váhy	Revitalizace parků	2022	ukončen 2024	500 000	vlastní prostředky
18	MČ Praha Klánovice	Studny na pozemcích ve správě MČ – studie a oprava	Studny	2022	ukončen 2024	2 480 000	1 500 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 a vlastní prostředky
19	MČ Praha Kolovraty	Zakládání travobylinných porostů	Realizace travobylinných ploch	2023	ukončen 2024	750 000	250 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024 a vlastní prostředky

20	MČ Praha Kolovraty	Snížení energetické náročnosti úřadu MČ	Snížování energetické náročnosti budov	2022	ukončen 2024		vlastní prostředky
21	MČ Praha Kolovraty	Retenční nádrž Tehovičky	Technické Retenční a zasakovací objekty	2022	ukončen 2024		500 000 Kč usnesením RHMP č. 645 ze dne 15. 4. 2024
22	MČ Praha Kolovraty	Zelená střecha na budově úřadu MČ	Vertikální vegetace a zelené střechy	2022	ukončen 2024		vlastní prostředky
23	MČ Praha Královice	Rekonstrukce systému vytápění v objektu čp. 66	Snížování energetické náročnosti budov	2022	ukončen 2024	6 280 621	2 500 000 Kč usnesením RHMP č. 1137 ze dne 16. 5. 2022 a vlastní prostředky
24	MČ Praha Lysolaje	Dolina - Město jinak park a okolí MŠ - FV elektrárna na střeše budovy komunitního centra	Fotovoltaika na budovách	2021	ukončen 2024	338 657	600 000 Kč usnesením RHMP č. 1452 ze dne 14. 6. 2021
25	MČ Praha Lysolaje	Park Dolina	Realizace nového parku	2021	ukončen 2024	6 300 000	5 600 000 Kč usnesením RHMP č. 1452 ze dne 14.6. 2021 a 2 000 000 Kč usnesením č. 1137 ze 16. 5. 2022
26	MČ Praha Nedvězí	Fotovoltaická elektrárna na budově úřadu MČ	Fotovoltaika na budovách	2022	ukončen 2024	3 376 974	1 200 000 Kč usnesením č. 1137 ze 16. 5. 2022, 740 000 Kč usnesením č. 5/64 ze dne 22. 06. 23 a vlastní prostředky
27	MČ Praha Přední Kopanina	Údržba zeleně v MČ - výsadba stromů	Výsadba stromů		ukončen 2024	165 290	200 000 Kč usnesením č. 19/31 ze 10. 9. 2020
28	MČ Praha Přední Kopanina	Naučná stezka Přední Kopanina	Vzdělávání a informování obyvatel města	2021	ukončen 2024	469 422	vlastní prostředky a dotace od Letiště Praha, a.s. ve výši 119 676 Kč


Celkem 128 133 802 Kč

Tab. 3.

Přehled ukončených projektů městských částí Prahy v roce 2024

Struktura realizovaných projektů MČ v r. 2024

Nejvíce ukončených adaptačních projektů městských částí Prahy se týkalo revitalizace vnitrobloků a zahrad, výsadby stromů a revitalizace veřejných prostranství.

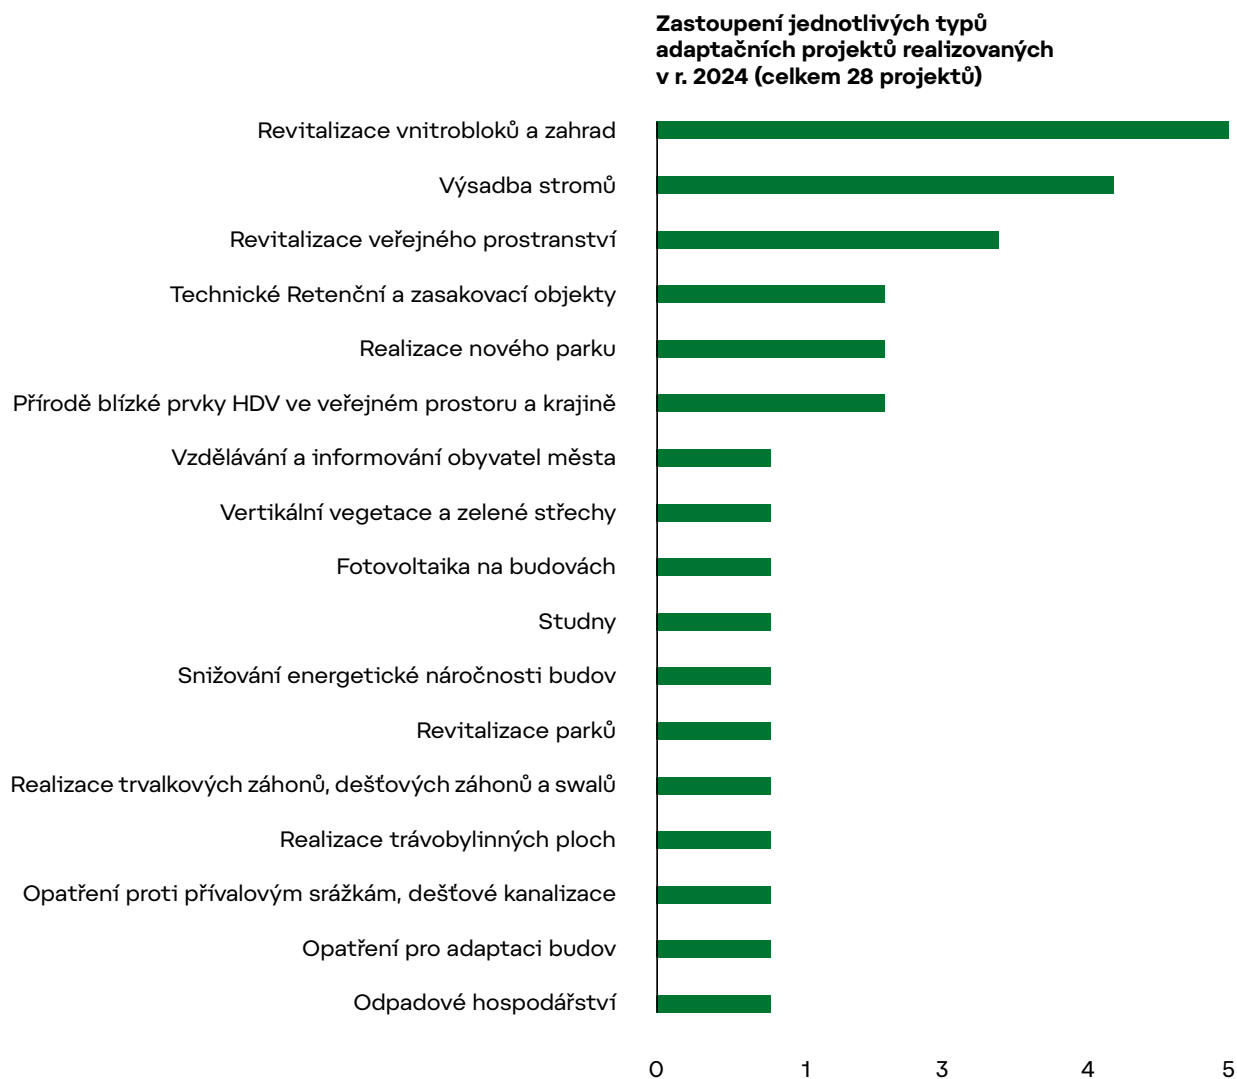

Projektové řízení IP 2020–2024

V roce 2024 se projektový tým Strategie adaptace věnoval především posílení a zvyšování dosahu komunikačních aktivit Strategie adaptace, podpoře adaptačních projektů městských částí a celkové revizi Zásobníku adaptačních projektů, který shromažďuje schválení adaptační projekty za celé pětileté období IP 2020–2024. Výsledky této celkové revize podrobně popisuje Hodnotící zpráva Implementačního plánu 2020–2024 Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (OCP MHMP, listopad 2024). Další důležitou aktivitou projektového týmu v roce 2024 bylo zpracování návrhu nového Implementačního plánu 2025–2029 pro další období realizace Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, které definuje priority naplňování Strategie adaptace a způsoby projektového řízení IP 2025–2029.

Komunikační aktivity Strategie adaptace v roce 2024

Projektový tým Strategie adaptace se soustředil nejen na intenzivní osobní komunikaci s představiteli adaptačních projektů městských částí a městských organizací, ale také na rozvoj nových komunikačních kanálů s dlouhodobým cílem oslovit úředníky, odborníky, zástupce neziskového sektoru, ale i širokou veřejnost.

Mezi hlavní komunikační aktivity Strategie adaptace v roce 2024 patřily:

- **Spuštění nového adaptačního newsletteru** určeného především pro odbornou veřejnost (<https://adaptacepraha.cz/newsletter-archiv>). Účelem newsletteru je pravidelně informovat odbornou veřejnost, úředníky HMP, zástupce neziskového sektoru a zájemce z řad obyvatel o aktivitách, výsledcích a projektech Strategie adaptace, Klimatického plánu Prahy do roku 2030 a Církulární strategie Prahy 2030. Newsletter byl projektovým týmem spuštěn v červnu 2024, k listopadu 2024 rozeslal celkem pět vydání a počet přihlášených odběratelů byl 253.
- Postupná **aktualizace webových stránek** adaptacepraha.cz. Projektový tým postupně aktualizoval obsah a strukturu webových stránek Strategie adaptace a pro rok 2025 plánuje jeho redesign v souladu s novým grafickým vizuálem HMP.
- Vytvoření **Komunikační strategie pro adaptační aktivity hl. m. Prahy**. Cílem dokumentu je nastavit dílčí cíle, priority a nástroje s důrazem na komunikaci směrem k veřejnosti a obyvatelům Prahy. Dokument je výchozím podkladem pro pravidelné Komunikační plány připravované pro každý projektový rok.

Vzdělávací aktivity

Strategie adaptace v roce 2024

Pod záštitou Strategie adaptace a OCP MHMP proběhlo v roce 2024 několik vzdělávacích a odborných akcí zaměřených na adaptační projekty a opatření nejen v Praze.

Akce pro veřejnost

Outdoorová kampaň ke zmírňování dopadů vysokých teplot na obyvatele Prahy

(Srpen 2024) Projektový tým připravil pilotní outdoorovou kampaň v ulicích Prahy na téma zvládnutí vln veder. Celkem čtyři video spoty na 110 obrazovkách na tramvajových zastávkách v centru Prahy přinášely tipy a rady pro obyvatele během dnů, kdy teplota přesahovala 26 stupňů Celsia.

Adaptterra Awards 2024

(Listopad 2024) I v roce 2024 pokračovala dlouhodobá podpora soutěže o nejlepší adaptační projekt v ČR – Adaptterra Awards, kterou organizuje Nadace Partnerství (<https://www.adaptterra-awards.cz/>). Cenu Prahy vyhrál Pavilon environmentálních studií ČZU.

Odborné semináře

Jak připravit kvalitní adaptační projekt

(Květen 2024) Seminář s exkurzí určený především pro úředníky městských částí Prahy. Pro Prahu jej pořádala Nadace partnerství a hlavní prezentace odkazovaly k příkladům dobré praxe toho, jak propojit veřejný prostor s požadavky na adaptační kvalitu. Jinak řečeno, tento seminář je důležitým krokem, který pomůže jednotlivcům v úředních rolích snáze aplikovat adaptační prvky do jednotlivých projektů. Seminář vedli Mgr. Martin Ander, Ph.D. a Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D., součástí programu byla také prezentace „Jak zadávat projekty na kvalitu, nikoliv jen na cenu – možnosti a zkušenosti“ právnice Kateřiny Rabiňákové. Součástí semináře byla také diskuze s radní pro životní prostředí a klima, Janou Komrskovou, exkurze do projektu Revitalizace školy Českobrodská vedl spoluautor projektu, Jiří Tencar ze společnosti Ecoten.

Mikroklimatická měření jako klíč k efektivní adaptaci

(Červen 2024) Odbor ochrany prostředí v r. 2024 zorganizoval každoroční konzultační setkání zaměřené na výzkumné projekty týkající se mikroklimatických měření městského prostředí. Ta, mimo jiné, poskytují fundamentální data k budoucím efektivním opatřením.

Mikroklimatická měření hrají důležitou roli v adaptaci měst na klimatickou změnu. Díky přesným a detailním datům lze totiž identifikovat problematické oblasti. Řešení, jako je například výsadba stromů, instalace zelených střech nebo úprava městské infrastruktury, umožňují účinně snižovat teplotu a zlepšovat celkový tepelný komfort v městských oblastech.

Setkání zacílilo na sdílení nových poznatků, metod a technologií, které přispívají k efektivnímu řízení městského mikroklimatu.

Mezi hlavní prezentace patřily výsledky společného projektu Operátora ITC a IPR Praha. Pilotní projekt Monitoringu mikroklimatických parametrů se zaměřuje na detailní sledování teplot, vlhkosti, větru a dalších klimatických faktorů v různých částech Prahy. Cílem je získat komplexní data nasbíraná za posledních 18 měsíců, která umožní naučit se lépe porozumět dynamice městského mikroklimatu.

Další klíčovou prezentací bylo Měření a mapování tepelného komfortu v Praze. Výzkum toho, jak se obyvatelé města cítí v různých klimatických podmínkách, spolu s vytvářením podrobných map tepelného komfortu, představují cenný nástroj pro plánování veřejných prostor, městské zeleně a dalších prvků, které zlepšují kvalitu života ve městě. Plánování v dlouhodobém horizontu je pak odpovědí na to, jak pracovat s modely a výsledky měření.

Konference

Urbanscapes 2024 - mezioborová konference k tématům adaptace měst

Konference vznikla za finanční podpory Strategie adaptace hl. m. Prahy, organizovala ji Česká asociace krajinářské architektury a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT. Fakulta architektury se ve dnech 21. a 22. května 2024 ponořila do tématu adaptace měst na klimatickou změnu: Pět zahraničních a 38 tuzemských přednášejících, celkem 297 posluchačů. Mezi posluchači byli krajinářští architekti, architekti, urbanisté, projektanti, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, Technické správy komunikací a Pražské vodohospodářské společnosti. Nejpočetnější skupinou však byli zástupci mimopražských městských samospráv.

Více informací o konferenci je možné nalézt online: <https://adaptacepraha.cz/ohlednuti-za-urbanscapes-dvoudenni-symposium-ktere-znovu-otevrela-temata-ktera-pali/>

Pracovní skupina pro adaptaci

Součástí naplňování IP 2020–2024 je i pravidelná činnost Pracovní skupiny pro Adaptaci.

Složení Pracovní skupiny pro adaptaci bylo aktualizováno usnesením číslo 2036 ze dne 30. 9. 2024 k personálnímu obsazení pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku Komise Rady HMP pro klima a pracovní skupiny pro adaptaci na změnu klimatu Komise Rady HMP pro klima.

Pracovní skupina se rozšířila o odborné zástupce příspěvkových organizací a společností HMP (Hřbitovy a pohřební služby Praha, IPR Praha, NKP Vyšehrad, TSK a.s.).

Pracovní skupina se sešla v roce 2024 dvakrát (11. 4. a 5. 11.).

Obsahem jednání pracovní skupiny 11. 4. 2024 byly následující body:

- Presentace výsledku nástroje Klimasken hl. m. Prahy – adaptační parametry hl. m. Prahy, stav k roku 2023
- Podpořené adaptační projekty ze strany MHMP 2023–2024
- Nastavení kritérií výběru projektů – parametry, indikátory, hodnoticí kritéria
- Implementace Městského standardu péče o ul. stromořadí – Metodika pěstebních cílů
- Konference k modrozelené infrastruktuře hl. m. Prahy

Obsahem jednání pracovní skupiny 5. 11. 2024 byly následující body:

- Projednání návrhu Monitorovací zprávy č. 4
- Projednání návrhu nového Implementačního plánu na roky 2025–2029
- Projednání návrhu Hodnotící zprávy IP 2020–2024

Souhrn a závěry

V rámci stávajícího zásobníku projektů je evidováno celkem 534 projektů městských částí, 146 projektů organizací města a odborů MHMP.

Po provedení celkové aktualizace projektového zásobníku je ke konci roku 2024 ukončeno celkem 278 projektů, 224 projektů dále probíhá, 106 projektů je dále vedeno ve fázi záměru.

V roce 2024 vedení hl. m. Prahy podpořilo adaptační projekty v rámci schváleného zásobníku následovně: Jeden projekt městské organizace ve výši 2,5 mil. Kč a 23 adaptačních projektů městských částí ve výši 23,87 mil. Kč.

V roce 2024 bylo zrealizováno 28 projektů městských částí a sedm projektů městských organizací a odborů MHMP, které jsou součástí schváleného projektového zásobníku.

Mezi nejčastější projekty realizované v r. 2024 patřila revitalizace vnitrobloků a zahrad, výsadba stromů a projekty revitalizace veřejných prostranství.

Hlavní aktivitou projektového týmu v roce 2024 byla celková revize aktuální podoby projektů ve schváleném projektovém zásobníku. Tato revize a její výsledky jsou podrobně popsány v Hodnotící zprávě Implementačního plánu 2020–2024 Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (OCP MHMP, listopad 2024).

Projekty městských částí a městských organizací zanesené v zásobníku adaptačních projektů budou v r. 2025 po své aktualizaci převedeny do nové projektové databáze IP 2025–2029 a podrobeny systému odborného hodnocení. Důraz bude kladen především na kvalitu a adaptační potenciál jednotlivých projektů. Posouzené a hodnocené projekty budou poté tvořit základ projektového zásobníku pro roky 2025–2029. Odbory MHMP, městské části i organizace s majetkovou účastí města budou nadále 1x ročně vyzývány k podání adaptačních projektů do zásobníku. Způsob a kritéria hodnocení budou předkladatelům projektů dostupné v rámci výzvy k přihlašování projektů do zásobníku. Adaptační projekty budou v novém Zásobníku seřazeny na základě tohoto hodnocení, dle jejich pořadí pak budou následně předkládány RHMP, která schvaluje jejich případnou finanční podporu.

Další prioritou v roce 2024 bylo zvýšení komunikačních aktivit Strategie adaptace a podpora projektu tvorby Koncepce a systému zelené infrastruktury v Praze jako hlavního adaptačního opatření města při snižování dopadu klimatických změn.

Příloha 1 – Monitoring vědeckovýzkumných projektů

Doporučení pro monitorování využití ukončených projektů:

Adaptační výzvy měst: Podpora udržitelného plánování s využitím integrované analýzy zranitelnosti (CzechGlobe, UI AV ČR).

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy (VÚV).

CORDEX: FPS Urbanization and Regional Climate Change "Proof of concept", v rámci projektu URBI PRAGENSI je tematika komplexnějších parametrizací vnesena do mezinárodní aktivity pro další zhodnocení modelování kvality ovzduší.

CURE H2020: Urban Heat Emissions Monitoring Application, Urban CO2 Emissions Monitoring Application, Urban Subsidence, Movements and Deformation Risk Application, (Foundation for Research and Technology Hellas, Crete, GISAT Praha a další partneři).

Časoprostorový model tepelného komfortu v městském prostředí a jeho aplikace pro udržitelné plánování měst (Ústav informatiky AV ČR, aplikační garant OCP MHMP).

DestinationEarth: Urban Heat Use Case – High-resolution heat stress indicator maps and climate adaptation scenario analysis for two demo cities (ECMWF, ESA, EUMETSAT, VITO, město Praha a Lisabon).

LIFE ASTI: Forecasting System for Urban Heat Island Effects (MFF UK, UNI Thessaloniki a další).

LIFE TreeCheck: Adaptační plánování přírodě blízkých řešení v zemích střední Evropy (CzechGlobe, Nadace Partnerství a další).

METCENAS: Veřejná sídlištní zeleň – Sociologický průzkum – komunitní péče o vegetaci ve veřejném prostoru (METCENAS, AMBIS).

Modelování realistického městského mikroklimatu a potenciálních adaptačních opatření (ÚI AV ČR, v. v. i., MFF UK, ČHMÚ).

Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí – měření mikroklimatických veličin ve vytipovaných lokalitách v Praze (Operátor ICT, IPR, OCP MHMP).

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy (VÚV).

Strategie zajištění udržitelného managementu povodí ovlivňující kvalitu vody v nádržích (FŽP ČZU).

SWAMP: Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině (FŽP ČZU, DEKONTA).

TEL4RAIN: Srážková pole s vysokým rozlišením získaný s využitím telekomunikačních mikrovlnných spojů (ČVUT FEL).

TURBAN: Modelování kvality ovzduší a tepelného komfortu s rozlišenou turbulencí v městském prostředí, (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i., ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Český hydrometeorologický ústav, Katedra fyziky atmosféry, MFF UK, Nansen Environmental and Remote Sensing Centre (NOR).

URBI PRAGENSI (MFF UK, ČHMU, UI AV ČR) Urbanizace předpovědi počasí, kvality ovzduší a klimatických scénářů pro Prahu.

Doporučení pro monitorování probíhajících projektů:

CARMINE: Climate-Resilient Development Pathways in Metropolitan Regions of Europe, Koordinátor: MeteoRomania, 32 partnerů, doba řešení: 2024–2027, <https://www.carmine-project.eu/>. Partner za Česko: Ústav Informatiky AV ČR, spoluřešitel: FŽP ČZU Praha. Hlavním cílem projektu CARMINE je pomoci metropolitním komunitám v Evropě stát se odolnějšími vůči změnám klimatu. K dosažení tohoto cíle CARMINE navrhuje interdisciplinární přístup zaměřený na (1) společnou tvorbu a vývoj rozhodovacích služeb a pokynů pro zvýšenou odolnost a adaptivní kapacitu, včetně systémů včasného varování a krizového řízení katastrof; (2) úzkou spolupráci s místními a regionálními komunitami (zainteresované strany a uživatelé), rozhodovacími a politickými činiteli (místními orgány) pro společný rozvoj rámců pro adaptační a zmírňující opatření napříč sektory; (3) poskytování vědecky podložených návrhů strategií pro adaptaci na klimatickou změnu na lokální a regionální úrovni. Proveditelnost navržených adaptačních opatření (zejména Nature Based Solutions) bude testována a prokázána prostřednictvím digitální replikace klimatických a socioekonomických charakteristik každé oblasti (tzv. Digital Twin).

Případová studie Praha (výzkum prováděný týmem z ÚI AV ČR a FŽP ČZU) je zaměřena na identifikaci zdravotního rizika spojeného s vysokými teplotami a koncentracemi znečištění v městském prostředí. Činí tak pomocí mikroklimatického modelování prostorové distribuce tepelné zátěže a znečištění v Praze a také prostřednictvím simulace dopadu vybraných (přírodě blízkých) adaptačních opatření na tepelnou zátěž a následného modelování zdravotních rizik (úmrtí a nemoci) spojených s horkem na úrovni městských částí.

CROSSEU: Cross-sectoral Framework for Socio-Economic Resilience to Climate Change and Extreme Events in Europe. Koordinátor: MeteoRomania, 15 partnerů z osmi zemí, doba řešení: 2024–2026, <https://crosseu.eu/>, partner za Česko: Fakulta životního prostředí ČZU Praha. Projekt CROSSEU reaguje na rostoucí společenské potřeby adaptace na očekávané dopady změny klimatu a zvýšení odolnosti regionů vůči socioekonomickým rizikům souvisejícími se změnou klimatu a extrémními událostmi v Evropě napříč ekonomickými sektory. Ve spolupráci s dotčenými skupinami a orgány (stakeholdery) bude připravovat interaktivní nástroj pro podporu rozhodování při přípravě strategií a politik pro zvýšení odolnosti vůči socioekonomickým dopadům klimatické změny. Výzkum prováděný týmem FŽP ČZU bude posuzovat dopady klimatické změny na zdravotnický sektor a možnosti modelování zdravotních (a socioekonomických) rizik spojených s nárůstem četnosti a intenzity vln veder v Česku. Přínos projektu zahrnuje kvantifikaci nákladů na stávající a budoucí socioekonomická rizika spojená s dopady změny klimatu na regionální úrovni NUTS3.

FOCI Non-CO2: Faktory a jejich dopady na klima, počasí, kvalitu ovzduší a zdraví. (MFF UK, HORIZON-CL5-2021D1-01-0). Cílem je snaha o lepší porozumění tokům skleníkových plynů a radiačních činitelů, včetně technologií odstraňování oxidu uhličitého. (KFA MFF UK Praha a další partneři).

Geohazards: Přírodní a antropogenní georizika (MŠMT a EU, UFA AVČR, IU AVČ, CzechGlobe a další). Účelem projektu je poznání přírodních a člověkem způsobených hrozeb a rizik ve svrchních sférách planety Země, vysvětlení příčin jejich vzniku a kvantifikace možných dopadů na lidskou společnost a infrastrukturu.

HORIZON EUROPE: Integrated Research Infrastructure Services for Climate Change risks (ÚVGZ).

I4C IMPETUS4CHANGE: Výzkumný projekt, který představuje významné vědecké pokroky, které zvýší kolektivní schopnost jednat a přizpůsobit se blízkým změnám klimatu (KFA MFF UK Praha a další partneři, ADAPTALAB pro města Praha, Paříž, Barcelona a Bergen).

Inovativní řešení oběhového hospodářství: (Horizon 2020) VŠCHT Praha, ČVUT Praha, PVS a.s., Storm Aqua.

Interreg SK-CZ: Jednotná identifikace zranitelnosti krajiny a metodologie návrhu adaptačních opatření se zvláštním zřetelem na ekosystémové funkce (UVGZ AV ČR, UKF Nitra, UPOL).

PERUN: Zlepšování předpovědí extrémního počasí nebo příprava klimatických scénářů, (ČHMÚ v rámci TAČR).

Project TAČR SEEPIA: Záměrem projektu Centrum socioekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí. (KFA MFF UK).

Město - Stavby: Součást připravovaného měření biometeorologických veličin v centru Prahy (Ústav informatiky AVČR a Univerzita Palackého v Olomouci, MČ Praha 7).

Projekt UpGreen: Analýza městské zeleně založená na satelitním pozorování Země v kombinaci s dostupnými daty, předpověď budoucího rozvoje městské zeleně, vize a plán pro návrh městské zeleně, monitorování, měření a vyhodnocování dopadu (Asitis, WorldfromSpace, Praha a další města).

SuPeRBE: Supporting Cross-scale Planning and Policy Readiness for a Resilient Built Environment (Podpora plánování a harmonizace politik pro odolnost životní prostředí). Trvání projektu: 06/2024–12/2026. Zapojení partneři na české straně: MČ Praha 5, ČVUT– UCEEB. Cíli projektu je následující: a) Vyvinout IT platformu integrující nástroje pro hodnocení a metodiky rozhodování, b) zvýšit kapacitu veřejných orgánů při zavádění, řízení a hodnocení adaptačních opatření v územních měřících, c) zapojit místní orgány veřejné správy do testování inovativních přístupů k adaptaci a řízení rizik, podporovat zavádění místních pokročilých klimatických služeb a d) začlenění adaptace na změnu klimatu ve městech do klíčových politických nástrojů.

TAČR: Mapování regionálního rozdělení České republiky z pohledu naléhavosti provedení adaptačních opatření na změnu klimatu – RegAdapt (UPOL, UVGZ, World from Space, ASITIS).

TAČR: Omezení negativních dopadů meteorologických extrémů (teploty, větru a srážek) na veřejné zdraví a životní prostředí ve velkých aglomeracích (OU Ostrava, ČHMÚ, MU Brno, UVGZ, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, INESAN).

TAČR: Role a management opomíjených typů sídelní zeleně pro udržitelný rozvoj sídel v době klimatické změny (MU Brno, OU Ostrava, UVGZ AV ČR, Nadace Partnerství).

Příloha 2 – Vybrané příklady realizovaných adaptačních projektů v roce 2024

MČ Praha 4

Pobytová zahrada Jílovská

Revitalizace zahrady odlehčovacího zařízení v Jílovské ulici v Praze 4 byla jedním z adaptačních projektů, které byly letos podpořeny Strategií adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Rekonstrukce areálu jednak plní cíl zlepšení sociálních služeb města, ale také přispívá k adaptaci veřejných prostor na současné klimatické výzvy.

Toto odlehčovací zařízení poskytuje krátkodobé pobyty pro zhruba 30 klientů. V rámci biografické péče se klade důraz na zapojení klientů do aktivit, které vykonávali během svého života a které mají rádi, například činnosti na zahradě nebo pobyt v přírodě.

Aktivní a relaxační zahrada zde byla vytvořena jako kvalitní přírodní plocha s ekosystémovými funkcemi a jako místo, kde se klienti zařízení přirozeně socializují. Nachází se zde dešťová zahrada, smyslová zahrada, zahrada s vyvýšenými záhony, kompostovací zařízení, zázemí komunitní zahrady a odpočinkové zóny k posezení.





Foto

Zahradní architektura Tábor s.r.o.

MČ Praha 7

Nová výsadba stromů Ortenovo náměstí

Na Ortenově náměstí byly vysazeny stromy za využití principů modrozelené infrastruktury, včetně péstebních opatření u stávajících stromů. Tato výsadba demonstruje, jak prvky modrozelené infrastruktury podporují růst nově vysazených stromů a zároveň zlepšují stav stávající zeleně.



Foto

MČ Praha 7, OCP MHMP

MČ Praha 20

Obnova Nolčova parku a parku Chvaly

V Nolčově parku byla provedena rozsáhlejší obnova zahrnující stavbu a obnovu chodníků, stavbu veřejného osvětlení, kácení vybraných stromů, terénní úpravy a výsadbu stromů, keřů a rostlin, stavba gabionové zdi a informačních panelů, instalaci herních prvků a mobiliáře, ale i stavbu zavlažovacího systému.



Foto

MČ Praha 20

MČ Praha Satalice

Založení květinového záhonu v ul. K Radonicům

Revitalizace stávajícího porostu, odstranění plevelu, hrubá a jemná modelace terénu, výsev a zapravení lučního semena, válcování terénu, potažení vrchní vrstvou substrátu, aplikace startovacího hnojiva.



Foto

MČ Praha Satalice

MČ Praha Vinoř

Předzámčí Vinořského zámku

Revitalizace zahrnuje řešení zasakování vod, odstranění asfaltových povrchů, výsadbu původních stromořadí, nově vedenou cyklostezku a mnoho dalších „zelených“ prvků v návaznosti na sousední kulturní památku Vinořský zámek.



Foto

MČ Praha Vinoř
